

Plan de dirección de proyecto

[Nombre del Proyecto]

Fecha: [dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Información del proyecto.....	4
Aprobaciones.....	4
Introducción.....	5
Planes de gestión de proyecto subsidiarios.....	6
Plan de gestión del alcance.....	6
Plan de gestión de requerimientos.....	6
Plan de gestión del cronograma.....	7
Plan de gestión de costos.....	7
Plan de gestión de calidad.....	8
Plan de gestión de recursos.....	8
Plan de gestión de comunicaciones.....	9
Plan de gestión de riesgos de un proyecto.....	9
Plan de gestión de adquisiciones.....	10
Plan de gestión de los interesados.....	10
Líneas base del proyecto.....	11
Línea base de alcance.....	11
Línea base de cronograma.....	11
Línea base de costo.....	12
Línea base para la medición del desempeño.....	12
Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos.....	13
Plan de gestión de cambios.....	13
Plan de gestión de configuración.....	13
Descripción del ciclo de vida del proyecto.....	14



Enfoque de desarrollo del plan de proyecto.....	14
Evaluaciones de la gerencia.....	15

Información del proyecto

Datos

Empresa / Organización	
Proyecto	
Fecha de preparación	
Cliente	
Patrocinador principal	
Gerente de Proyecto	

Patrocinador / Patrocinadores

Institución	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Proinversion			
MTC			

Aprobaciones

Nombre / Cargo	Fecha	Firma

Introducción

Se te ha asignado el rol de director de proyectos. Conforme a la teoría y a los ejemplos, desarrolle el plan de proyectos para [este enlace](#).

Plan de gestión del alcance

El plan de gestión de alcance debe incluir procedimientos para elaborar:

La definición de alcance.

Estructura de desglose de trabajo (EDT).

Aprobación y modificación de la línea base de alcance.

Aprobación de los entregables del plan de proyecto.

Plan de gestión del alcance

El plan de gestión de alcance debe incluir procedimientos para elaborar:

La definición de alcance:

Construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero el cual se ubicará en la región Cusco, en la provincia de Urubamba, distrito de Chinchero, en un plazo establecido de acuerdo con las especificaciones técnicas establecida en los términos de referencia y contrato.

Estructura de desglose de trabajo (EDT):

Contrato

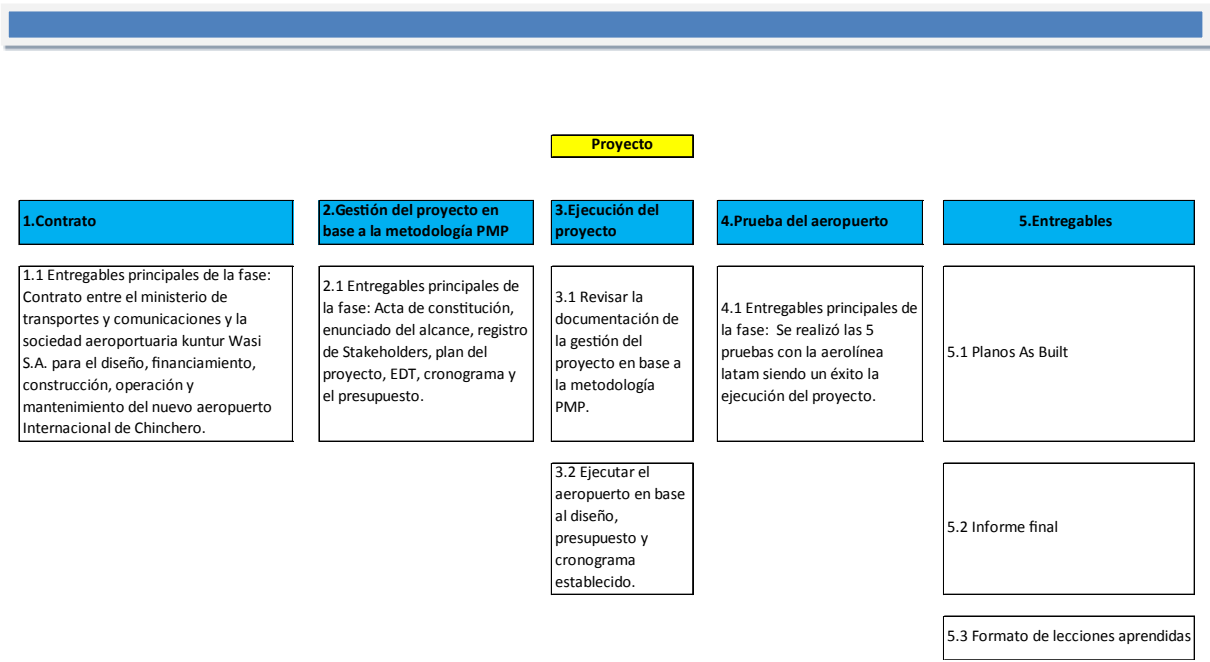
Gestión del proyecto en base a la metodología PMP

Ejecución del proyecto

Prueba del aeropuerto

Entregables

Aprobación y modificación de la línea base de alcance.



Aprobación de los entregables del plan de proyecto.

a. Consideraciones para la iniciación de esta fase:

- Presentar los entregables a OSITRAN y el ministerio de transporte y comunicaciones.

b. Consideraciones para el cierre de la fase:

- OSITRAN y el ministerio de transportes y comunicación aprueba los entregables el proyecto queda cerrado.

Plan de gestión del cronograma

Los Criterios y actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma de proyecto (Metodología y herramientas para elaborar el cronograma, Procedimiento para actualizar el estatus del cronograma durante el proyecto.)

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Nombre del Proyecto	siglas
Construcción y Operación del Aeropuerto Internacional Chincheros Cuzco	COA/CC

Metodología de programación

La programación del proyecto se realizara teniendo en cuenta las Buenas prácticas propuestas por el PMI para la gestión del tiempo.

Herramientas de programación

La programación se realizará con el apoyo de las siguientes herramientas:

- Diagramas de red
- Diagrama de Gant
- MIRO

Unidades de medida

- La duración del proyecto se estimará en meses
- La estimación de las actividades, cuando sean de corta duración se podrá expresar en días.

Identificación de actividades

- Las actividades identificadas que se usaran para este proceso de planificación se extraerán del Diccionario del EDT, donde por cada paquete de trabajo se describen sus actividades.
- Cada actividad tendrá un código que sea coherente con el de su paquete de trabajo en el EDT.

Secuencialización de actividades

- Primero se establecerá la secuencia de las actividades por cada paquete de trabajo.
- Luego se establecerá la secuencia de los paquetes de trabajo para poder obtener la secuencia de todo el proyecto, el cual será graficado en un diagrama de red.

Estimación de la duración de las actividades

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso asignado a la actividad:

- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la actividad.
- En cambio si el tipo de recursos es material o maquinarias, se define la cantidad que se utilizará para realizar la actividad.

Desarrollo del Cronograma

En base a los siguientes documentos:

- Identificación y Secuenciamiento de Actividades.
- Red del proyecto.
- Estimación de Recursos y Duraciones.

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, que se hará mediante la herramienta de Miro.

El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto.

Actualización, supervisión y control

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Performance del Trabajo e Informe de Performance del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. Es mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el Cronograma del proyecto.

Además que cualquier modificación en el cronograma, deber ser solicitado con una Solicitud de cambios y debe ser debidamente aprobado por el comité de control de cambios.

Plan de gestión de costos

Establece como se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto

PLAN DE GESTION DE COSTOS

Nombre del Proyecto	siglas
Construcción y Operación del Aeropuerto Internacional Chincheros Cuzco	COAICC

Tipos de estimación de Proyecto

Sera por presupuesto

Planificación gradual

El presupuesto de la obra está dividido en dos etapas

La primera parte denominada PPO 1 (pago por obras sub etapa 1)

El monto de esta primera etapa es de US\$

121,032,679.00

La segunda parte denominada PPO 2 (pago por obras sub etapa 3)

El monto de esta segunda etapa es de US\$

264,758,697.00

Umbrales de control

La obra está dividida en dos sub etapas

Cada una (PPO 1 y PPO 2) tiene su propio presupuesto

En el caso de las valorizaciones de PPO 1 El CONCEDENTE le pagara al CONCESIONARIO en cuotas bimestrales de acuerdo a los hitos ejecutados (movimiento de tierras)

Puede haber un adicional hasta del 20% monto de los estudios de preinversion a nivel de factibilidad en el PPO1

En el caso de las valorizaciones de PPO 2 el CONCEDENTE le pagara al CONCESIONARIO en cuotas trimestrales de acuerdo a los hitos ejecutados que serán cofinanciadas a través del fondo de pagos PAO, el mismo que incluirá los intangibles y las actividades relacionadas al instrumento de gestión ambiental, conforme al cronograma establecido en el Programa de Obras.

Métodos de medición de valor ganado		
Alcance	Método de medición	Modo de medición
- Sera por fases - Las fases serán PPO 1 y PPO 2	Se medirá el avance usando los siguientes métodos: - Diagramas de red - Diagrama de Gant - MIRO	-La primera etapa se medirá cada dos meses - La segunda etapa cada tres meses -La estimación de las actividades, cuando sean de corta duración se podrá expresar en días.

Plan de gestión de recursos

Identificar y cuantificar los recursos requeridos

Plan de gestión del equipo establecido para el plan de proyecto.

Roles y responsabilidades asignados al proyecto.

Plan de gestión de riesgos de un proyecto

Registro y seguimiento de los riesgos en el plan de proyecto.

Metodología del Plan de Gestión de Riesgos

Matriz de Procesos vs Areas de Conocimiento

Area de Conocimiento	Grupo Proceso de Planificación	Grupo de Proceso de Seguimiento y Control
Gestion de Riesgo del Proyecto	Planificar Gestión de Riesgos	Controlar los Riesgos
	Identificar los Riesgos	
	Realizar el análisis Cualitativo de los Riesgos	
	Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos	
	Planificar la Respuesta a los Riesgos	

Planificación:

- Comunicación y consulta
- Establecer el Contexto
- Evaluación de Riesgos
- Identificación de Riesgos
- Análisis de Riesgos
- Evaluación de Riesgos
- Tratamiento de Riesgos
- Monitoreo y Revisión

Identificación de Riesgos:

- Riesgos por desastre natural: terremotos, evaluar antecedentes históricos de la zona de construcción.
- Riesgos Políticos: cambio de gobierno, monitorear constantemente la situación política del país.
- Riesgo Social: la probabilidad de pérdidas y daños asociados con la presencia de amenazas y vulnerabilidades en poblaciones y bienes.
- Riesgos Legales y Contractuales, incumplimiento de contratistas y subcontratistas, penalidades por atraso en cumplimiento de hitos contractuales.

- Riesgo Ambiental: asume de manera amplia una realidad compleja dada en la interacción del medio natural, el medio construido o físico y el medio social. Evaluar datos históricos de la zona y las de influencia, actualizándolos mensualmente.
- Riesgos Financieros, como consecuencia de ser una cooperación público-privado
- Riesgos de diseño, revisar los informes de la Contraloría General de la República

Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos

Matriz de Análisis de Riesgos

			Probabilidad				
			Raro	Poco Probable	Probable	Muy Probable	Casi Seguro
			0.05	0.1	0.2	0.4	0.8
Consecuencias de Riesgo	Despreciable	0.1	0.005	0.01	0.02	0.04	0.08
	Menores	0.3	0.015	0.03	0.06	0.12	0.24
	Moderadas	0.5	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4
	Mayores	0.7	0.035	0.07	0.14	0.28	0.56
	Catastróficas	0.9	0.045	0.09	0.18	0.36	0.72

	Riesgo Bajo
	Riesgo Medio
	Riesgo Alto

Planificar la Respuesta a los Riesgos

- Reactivar el ciclo de identificación/respuesta.
- Actualizar registros de riesgos (nuevos riesgos).
- Documentar lecciones aprendidas y soluciones.
- Validar supuestos.
- Vigilar los disparadores.
- Vigilar riesgos residuales y secundarios

- 
- Comprobar la efectividad del proceso
